

新社屋建設 進捗状況について (2023年2月)

完成予定図 (実施設計段階のイメージ)



2022年 10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月
上棟		躯体 工事 完了	内装工事 設備工事	大型機器搬入 足場解体完了	受電・通水 官庁検査 竣工 引渡し (3月末)	竣工祈禱 (4/12) 内覧会 (4/19)	新社屋 業務開始 (5/15) 竣工式 (5/29) 予定)	地域 見学会 (6/25)
完成度 52%	65 %	77 %	85 %	95 %	100 %			




2022.10 上棟時の様子



2023.1 現在の様子

完成予定図 （多くの市民が集い、地域に開かれた新社屋を目指して）

- ・市民参加型(100名規模)の防災体験教室等を実施
- ・地域の会議や研修会など多目的に活用

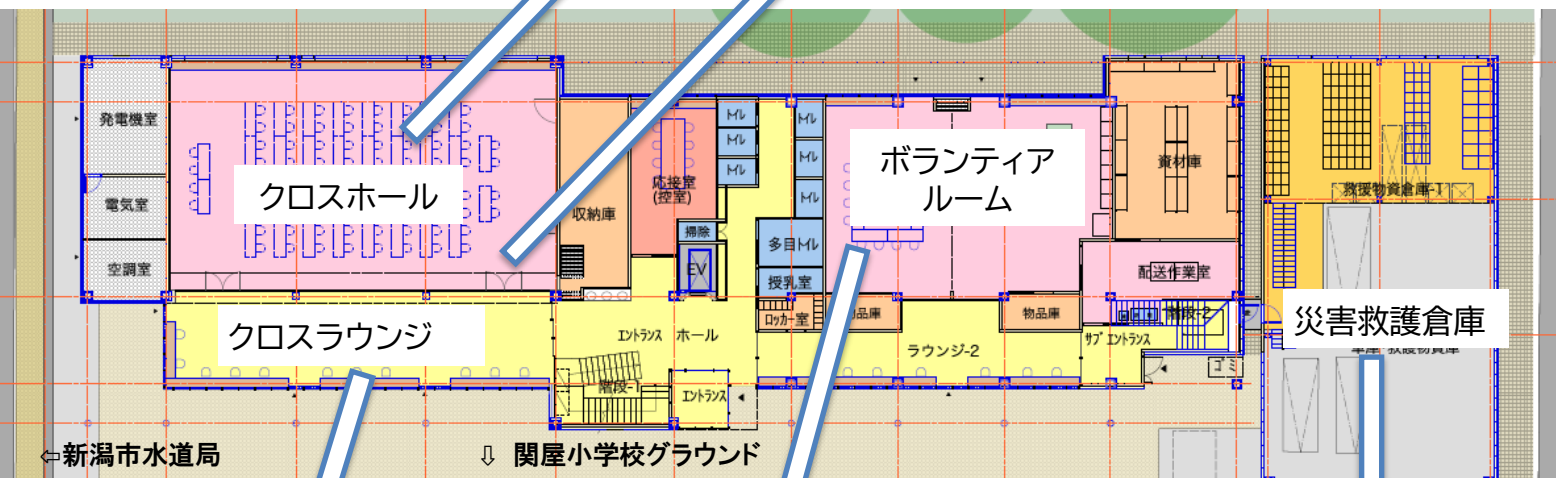

- ・地域の皆様の交流の場
- ・学生の学習スペースなど



- ・救護資機材等の見学や防災訓練の受入れ



- ・ボランティア活動の拠点
- ・学校の部活やサークル活動など

